


经开区 2023 年城镇污水处理提质增效工程

项目概况

本项目主要对钵池街道范围内“05-01”、徐杨街道范围内“05-06”“01-06”三个达标区内存在问题的小区、公共建筑等进行管道维修和雨污分流改造，在无污水管网的道路新建污水管网，对存在混接的雨污水管网进行改造，完善需要配套实施的工程。

项目平面布置图

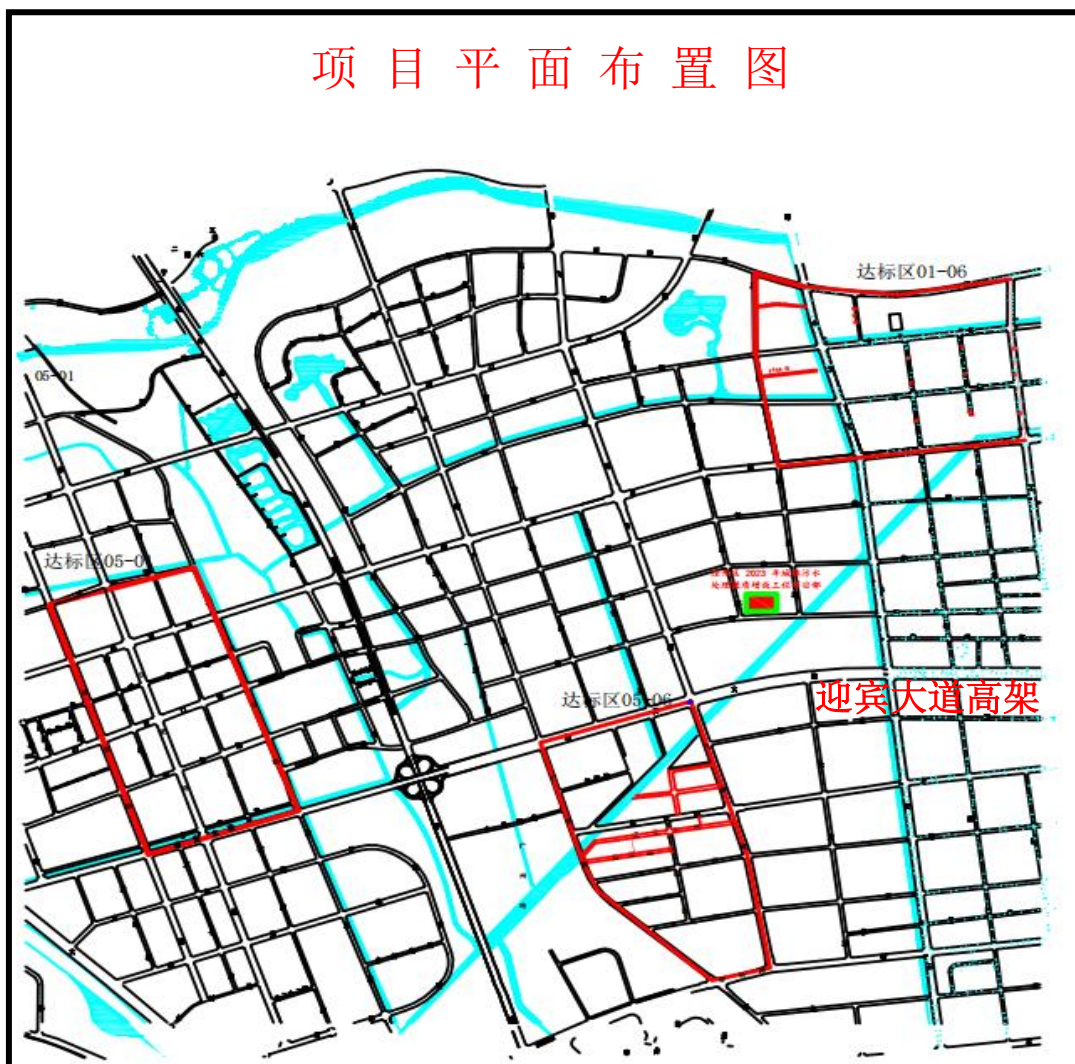

工 程 名 称	经开区 2023 年城镇污水处理提质增效工程一阶段施工	工 程 地 点	淮安经济技术开发区
建 设 规 模	/	开 工 日 期	2023 年 07 月 18 日
建 设 单 位	淮安经济技术开发区住房和城乡建设局	竣 工 日 期	2024 年 09 月 05 日
项目管理单位	淮安城市开发建设有限公司	工 期	
设 计 单 位	南京大学环境规划设计研究院集团股份公司	合 同 造 价	6366 万元
承 包 单 位	江苏捷达交通工程集团有限公司	施 工 造 价	
监 理 单 位	江苏华盛工程咨询股份有限公司	安 监 机 构	淮安经济开发区工程质量安全监督站
质 监 机 构	淮安经济开发区工程质量安全监督站	工 程 地 点	淮安经济技术开发区

验收范围及数量:

本项目完成居民小区以及公共建筑和企事业单位管网雨污分流改造，积水点、塌陷点、新增污水管网等市政管网建设，新建雨水泵站等工程项目，具体工程量如下：

一、居民小区雨污分流改造

已完成达标区“320871-01-06”：佳兴北苑，达标区“320871-05-06”：南方花园，达标区“320871-05-01”：盛华和美居东、西区、米兰花园、天香花苑、东方凯旋城、福地锦绣华庭、鼎立香榭丽花苑、南馨豪庭、维多莉雅、都市桃园、文景君庭、罗马假日，共改造污水 8.83km、雨水 22.36km。

二、公共建筑和企事业单位雨污分流改造

淮安邮区中心局、江苏水文水资源勘察局、二院厦门路院区、深圳路派出所、淮安仲裁委员会、交警三大队、如意园、开发区消防大队等 8 个公共建筑和企事业单位管网雨污分流改造；共改造污水 698m、雨水 610m。

三、市政管网建设

红豆路与白果路交叉口东卓文学校西、深圳东路嘉奥生物门口、红豆美墅公园里北门、青岛路（YSQDL73-YSQDL72）点状修复、杰杰工具西门管道修复、大寨河 30 号截流井塌陷注浆、G233 国道与海口路交叉口等 128 处积水点、塌陷点、管道紫外光固化 DN1000 修复、新建管网等市政管网改造工程；共完成 5.06km 管道，369 座雨水算，点状修复 22 环，光固化修复 197.7m。

四、新建雨水泵站

新建广州路雨水泵站：规模 3.0m³/s，配套箱式变电站 SCB14-630KVA；新建富淮路泵站：规模 3.0m³/s，配套箱式变电站 SCB11-500KVA。
